



Comune di Vezzano

Sul Crostolo

P.zza della Libertà 1

42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

**Completamento della rete
pedonale esistente in loc. La Vecchia,
in fregio alla S.S. 63**

CRONOPROGRAMMA LAVORI


Reggio Emilia 21/04/2026

il tecnico

Ing. Ermanno Panciroli

Untitled Gantt Project

Diagramma di Gantt

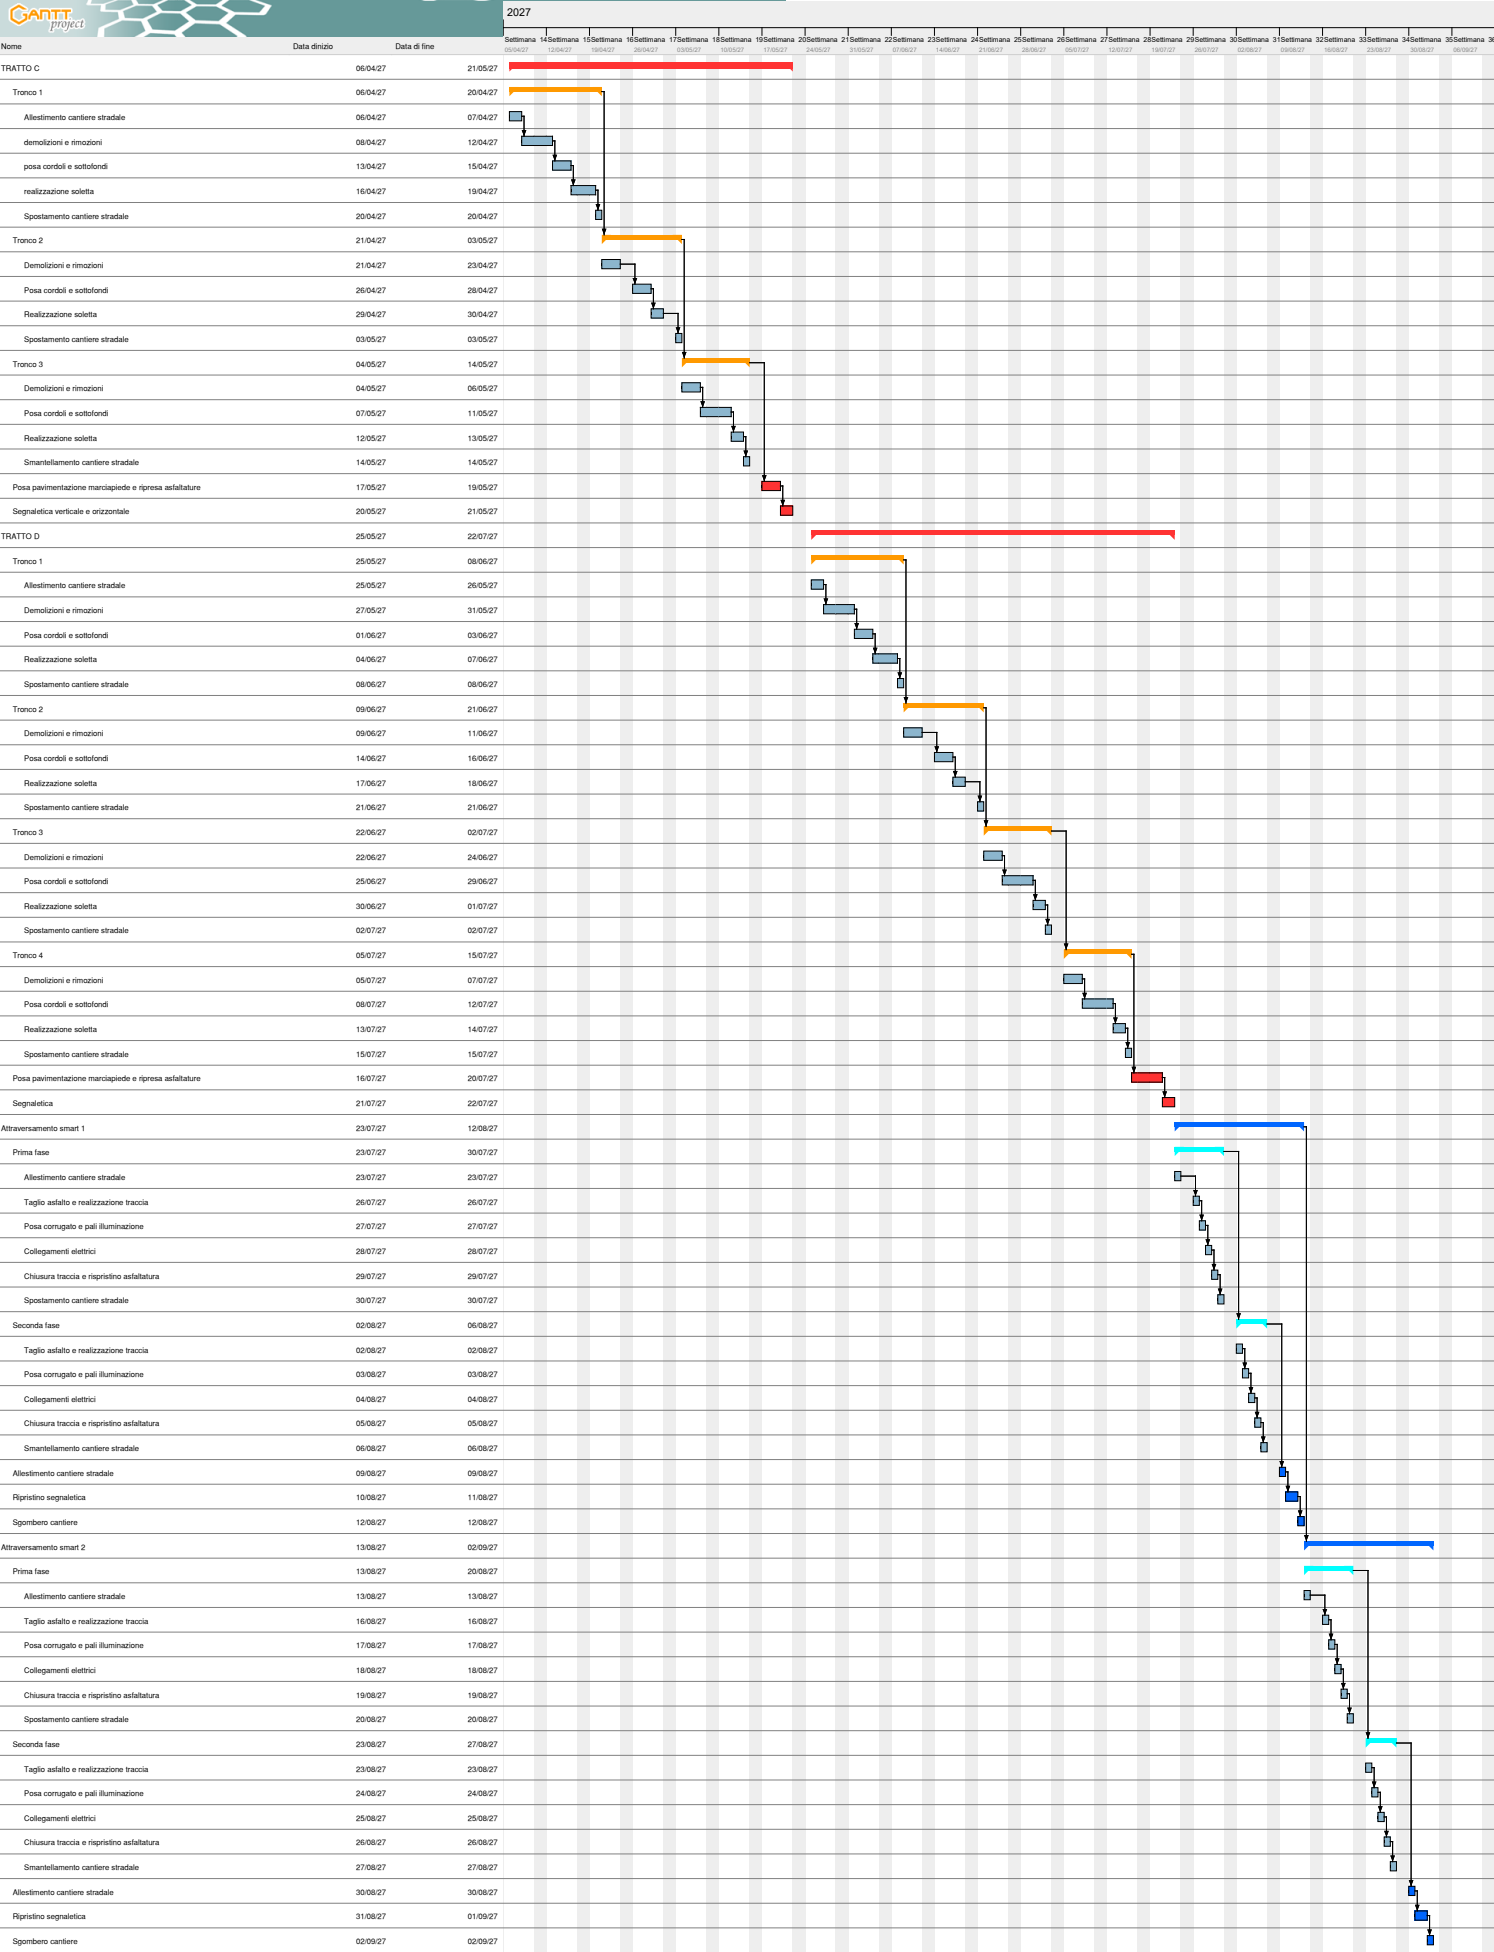

Attività

Nome	Data inizio	Data di fine
TRATTO C	06/04/27	21/05/27
Tronco 1	06/04/27	20/04/27
Allestimento cantiere stradale	06/04/27	07/04/27
demolizioni e rimozioni	08/04/27	12/04/27
posa cordoli e sottofondi	13/04/27	15/04/27
realizzazione soletta	16/04/27	19/04/27
Spostamento cantiere stradale	20/04/27	20/04/27
Tronco 2	21/04/27	03/05/27
Demolizioni e rimozioni	21/04/27	23/04/27
Posa cordoli e sottofondi	26/04/27	28/04/27
Realizzazione soletta	29/04/27	30/04/27
Spostamento cantiere stradale	03/05/27	03/05/27
Tronco 3	04/05/27	14/05/27
Demolizioni e rimozioni	04/05/27	06/05/27
Posa cordoli e sottofondi	07/05/27	11/05/27
Realizzazione soletta	12/05/27	13/05/27
Smantellamento cantiere stradale	14/05/27	14/05/27
Posa pavimentazione marciapiede e ripresa asfaltature	17/05/27	19/05/27
Segnaletica verticale e orizzontale	20/05/27	21/05/27
TRATTO D	25/05/27	22/07/27
Tronco 1	25/05/27	08/06/27
Allestimento cantiere stradale	25/05/27	26/05/27
Demolizioni e rimozioni	27/05/27	31/05/27
Posa cordoli e sottofondi	01/06/27	03/06/27
Realizzazione soletta	04/06/27	07/06/27
Spostamento cantiere stradale	08/06/27	08/06/27
Tronco 2	09/06/27	21/06/27
Demolizioni e rimozioni	09/06/27	11/06/27
Posa cordoli e sottofondi	14/06/27	16/06/27
Realizzazione soletta	17/06/27	18/06/27
Spostamento cantiere stradale	21/06/27	21/06/27
Tronco 3	22/06/27	02/07/27
Demolizioni e rimozioni	22/06/27	24/06/27
Posa cordoli e sottofondi	25/06/27	29/06/27
Realizzazione soletta	30/06/27	01/07/27
Spostamento cantiere stradale	02/07/27	02/07/27
Tronco 4	05/07/27	15/07/27
Demolizioni e rimozioni	05/07/27	07/07/27
Posa cordoli e sottofondi	08/07/27	12/07/27
Realizzazione soletta	13/07/27	14/07/27
Spostamento cantiere stradale	15/07/27	15/07/27
Posa pavimentazione marciapiede e ripresa asfaltature	16/07/27	20/07/27
Segnaletica	21/07/27	22/07/27

Attività

Nome	Data inizio	Data di fine
Attraversamento smart 1	23/07/27	12/08/27
Prima fase	23/07/27	30/07/27
Allestimento cantiere stradale	23/07/27	23/07/27
Taglio asfalto e realizzazione traccia	26/07/27	26/07/27
Posa corrugato e pali illuminazione	27/07/27	27/07/27
Collegamenti elettrici	28/07/27	28/07/27
Chiusura traccia e ripristino asfaltatura	29/07/27	29/07/27
Spostamento cantiere stradale	30/07/27	30/07/27
Seconda fase	02/08/27	06/08/27
Taglio asfalto e realizzazione traccia	02/08/27	02/08/27
Posa corrugato e pali illuminazione	03/08/27	03/08/27
Collegamenti elettrici	04/08/27	04/08/27
Chiusura traccia e ripristino asfaltatura	05/08/27	05/08/27
Smantellamento cantiere stradale	06/08/27	06/08/27
Allestimento cantiere stradale	09/08/27	09/08/27
Ripristino segnaletica	10/08/27	11/08/27
Sgombero cantiere	12/08/27	12/08/27
Attraversamento smart 2	13/08/27	02/09/27
Prima fase	13/08/27	20/08/27
Allestimento cantiere stradale	13/08/27	13/08/27
Taglio asfalto e realizzazione traccia	16/08/27	16/08/27
Posa corrugato e pali illuminazione	17/08/27	17/08/27
Collegamenti elettrici	18/08/27	18/08/27
Chiusura traccia e ripristino asfaltatura	19/08/27	19/08/27
Spostamento cantiere stradale	20/08/27	20/08/27
Seconda fase	23/08/27	27/08/27
Taglio asfalto e realizzazione traccia	23/08/27	23/08/27
Posa corrugato e pali illuminazione	24/08/27	24/08/27
Collegamenti elettrici	25/08/27	25/08/27
Chiusura traccia e ripristino asfaltatura	26/08/27	26/08/27
Smantellamento cantiere stradale	27/08/27	27/08/27
Allestimento cantiere stradale	30/08/27	30/08/27
Ripristino segnaletica	31/08/27	01/09/27
Sgombero cantiere	02/09/27	02/09/27
